


Informe de Mantenimiento

Marzo 22

Desde la Gestion de La Marquesa Golf se informa de los trabajos realizados durante el último mes en el campo siguiendo con las tareas establecidas en nuestro plan anual.

Ha sido un mes climatológicamente inusual comparado con años anteriores ya que las temperaturas diurnas han sido templadas y las noches frescas, pero sin llegar a grados extremos como sufrimos en el mes anterior. La lluvia ha sido beneficiosa y se han registrado más de 150 litros por metro cuadrado en este mes de marzo. Nos ha beneficiado para despertar de la latencia invernal a nuestras especies cespitosas de clima cálido, pero al mismo tiempo el exceso de humedad ha reavivado la enfermedad del dólar spot en algunos de nuestros greens.

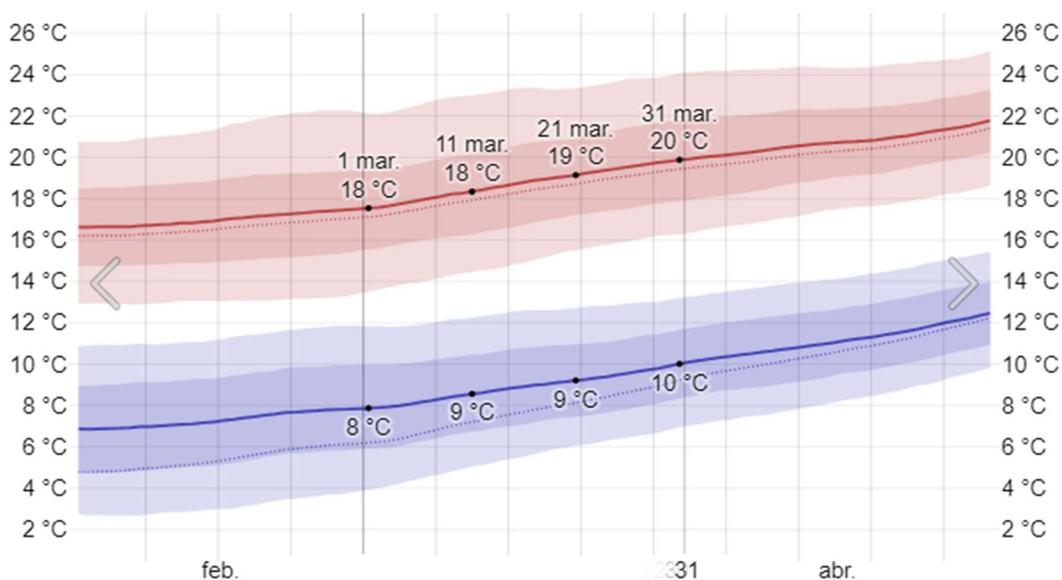

GREENES:

Se ha conseguido un hábito exponencial en el crecimiento de la planta, con lo que nos lleva a la siguiente fase de actuaciones en los greens.

También se ha continuado con la fertilización y se ha realizado un abono foliar a los greens.

Comenzamos a implantar siegas verticales junto a las siegas helicoidales para controlar la materia orgánica inerte que se puede acumular en el colchón del Green.

Viendo que después del micro pinchado la rodadura de la bola no era de una homogeneidad adecuada para nuestro gusto, se ha decidido adquirir un juego de micro pinchos más finos, esto mejorará la rodadura de la bola y facilitará el cierre de la hierba.

Con el mismo fin, el rulo se sigue pasando una vez a la semana, al menos en las semanas que el campo no estaba demasiado blando.

Se ha optado por un recebo suave con una mezcla de arena nitrogenada a las zonas más débiles para mejorar su cobertura vegetal.

También a final de mes se realizó un recebo de piques en general.

Por último en los greens se ha tenido que realizar un tratamiento fitosanitario, ya que las lluvias acontecidas en los últimos días han disparado la humedad en su superficie, fortaleciendo la entrada del patógeno del dólar en la hoja. Se ha tomado la decisión de recebar por completo el Green del 18, ya que no termina de recuperar una homogeneidad completa y para una más rápida recuperación. Agradecemos su comprensión por las posibles molestias que les haya podido ocasionar.



Se puede observar una mayor cobertura y las zonas donde se ha recebado para cubrir totalmente su superficie.



Green 18 atacado severamente por el dólar spot, tratado fitosanitario y recebado

FAIRWAYS Y TEES

Las lluvias han producido un rápido crecimiento de nuestras especies cespitosas en las calles como en los tees, por lo cual se procede a comenzar las labores correspondientes para trabajar el pennisetum clandestinum como especie cespitosa predominante. El siguiente paso ha sido bajar la altura de corte de la siega agregando al mismo tiempo una mayor continuidad de corte a las labores semanales. Igual que en los greens, se realiza recebos selectivos con arena nitrogenada en las zonas con menos cobertura vegetal para su mejor recuperación.

La frecuencia de corte se ha aumentado ante el mayor crecimiento de la hierba.

Se ha realizado un dibujo nuevo de la calle 9 priorizando un primer golpe más hacia la zona izquierda de la calle. De esa parte se han quitado los olivos y trasplantados a otras zonas del campo.

Buscando darle una mayor visualidad a nuestro campo se ha optado por agrandar las calles de ciertos pares 3, al mismo tiempo que se realizan pasillos desde los tees a las calles.



Recebo de calles



Recebo de tees



Caminos de tee a calle

BUNKERS:

Los bunkers siguen con su planificación específica, rastrillándose diariamente para el borrado de huellas del día anterior.

Nuestra prioridad en los bunkers es el mantenimiento de su perfilado por su gran visualidad y por ello se perfilan y se siegan los taludes de hierba quincenalmente.

ROUGH Y ORILLAS:

Se han intensificado las labores en el rough y en las orillas del campo para mantener un aspecto de limpieza. Un mes difícil para estas zonas ya que las lluvias han acrecentado exponencialmente el crecimiento de la planta y, por consiguiente, las labores a realizar en dichas zonas. También se ha desbrozado las zonas de los lagos y putting Green.


Se sigue diseñando zonas de hard line, para agilizar el juego y mantener una mejor limpieza en el campo, por lo cual se han perfilado dos nuevas zonas de paisajismo práctico, una en la calle del 5 y otra en la calle del 8. En los próximos días se llevará a cabo la limpieza en el interior de dichas zonas.

Se sigue buscando una mejor visualidad a nuestro campo, por ello siendo amantes de economía circular y la economía sostenible, queremos aprovechar nuestros restos de poda para darle a zonas del campo un aspecto más natural y por ello hemos rellenado el camino de acceso al Green 16 de con estos restos naturales.

En el rough se ha comenzado con un mantenimiento diario ya que su crecimiento ya es excesivo y tenemos que mantenerlo a su altura óptima para la práctica del golf. Su altura de corte se ha reducido hasta los 20 milímetros

para mantener una homogeneidad mayor y al mismo tiempo luchar con la proliferación de la hoja ancha.

Respecto a la hoja ancha también se está llevando a cabo una eliminación mediante la aplicación de químicos.

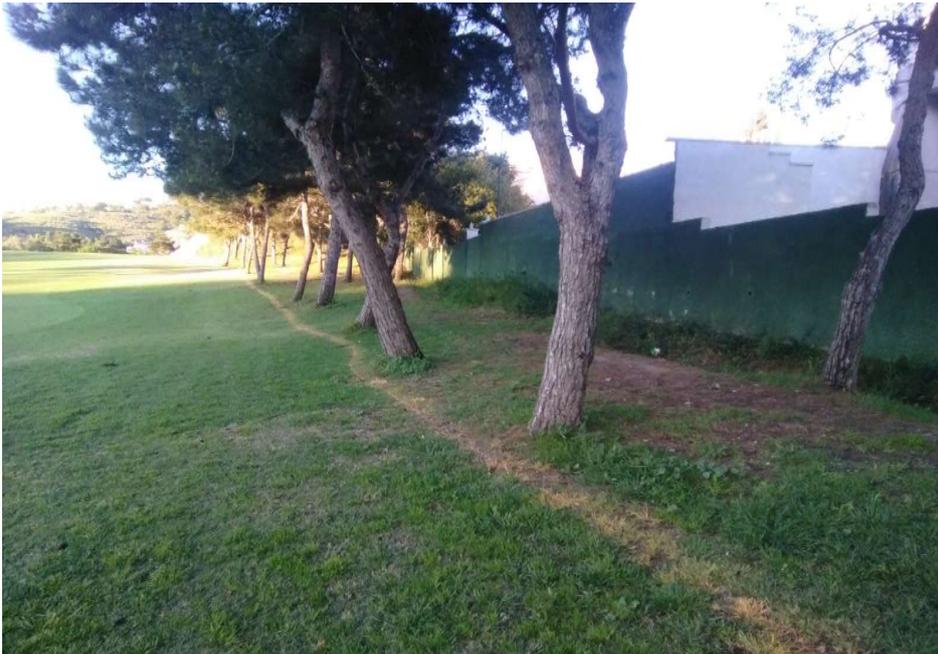

Perfilado del diseño paisajístico práctico orilla de la calle 5





OTRAS LABORES:

Se sigue trabajando en el mantenimiento y mejoras en el mobiliario del campo, como la reposición de las barandillas del puente de la calle 4, retirándolas las de hierro por una barandilla más funcional de madera.

Se sigue con las reformas hidráulicas en el campo para una mayor optimización del agua de riego, por lo cual seguimos colocando un riego por goteo a nuestro arbolado, en este caso a la zona de olivos trasplantados a la zona del hoyo 5.

Se está pintando las paredes del campo de prácticas y desbrozando todos sus alrededores.

Se sigue con las actuaciones de mantenimiento general de nuestro arbolado, este mes se ha seguido con podas de mantenimiento y de formación, ya que muchos de nuestros ejemplares comenzaran su floración en breve con la mejora de las temperaturas y lo estamos adecuando a la siguiente fase de su ciclo vital.

Se ha continuado con el trasplante de los olivos.

Se ha realizado el riego por goteo de las pawlonias del tee de prácticas.

Se ha desbrozado tanto la zona del tee como del Green del hoyo 7.

Los días de tormenta provocaron varias caídas de Mimosas y se procedió a quitarlas, por ejemplo, en el hoyo 12 y en el hoyo 5.

Se realiza perfilado de aspersores que nos ayuda a mejorar el riego.

Se está adaptando la maquina escarificadora de tees para las calles.

Se han ido quemando peanas de los árboles.

Se ha comenzado con el estudio de la aplicación de ultrasonidos en los lagos para mantenerlos libres de algas durante todo el año.





- Alturas de corte:
 - Greens: 3.5mm
 - Calles: 9 mm
 - Tees: 9mm.
 - Rough: 25 mm.

Seguimos trabajando dentro del plan establecido y esperamos que encuentren el campo cada día mejor. Ahora empieza una época buena para la hierba y solo esperamos que el dollar spot, que es nuestra mayor preocupación, no nos ataque con la subida de temperaturas.

¡Un muy cordial saludo y que disfruten de una primavera con mucho golf!

Juan José Rodríguez García
Head Greenkeeper


Guillermo Navarro
Director General
La Marquesa Golf
